

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Martin Baur GmbH
Riedstraße 2
88521 Binzwangen

Prüfung-Nr.: 2022/N/Wand/01

Prüfung am: 23.08.2022

Material-Nr.: 18032

Bezeichnung: Kiessand 0/45

Norm: TL SoB-StB 04

Hersteller: Kieswerk Neufra
88499 Riedlingen- Neufra

Kategorie: OC 90;UF 5;SI 50

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kieswerk Neufra

Wandkies

Entnahmedatum: 23.08.2022 (KW:34)

Entnahmeort: Kieswerk Neufra

Entnahmestelle: Kieswand


Probenehmer: Johannes Kraus

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: ca 60 kg

Probeneingang: 23.08.2022

Prüfergebnisse:

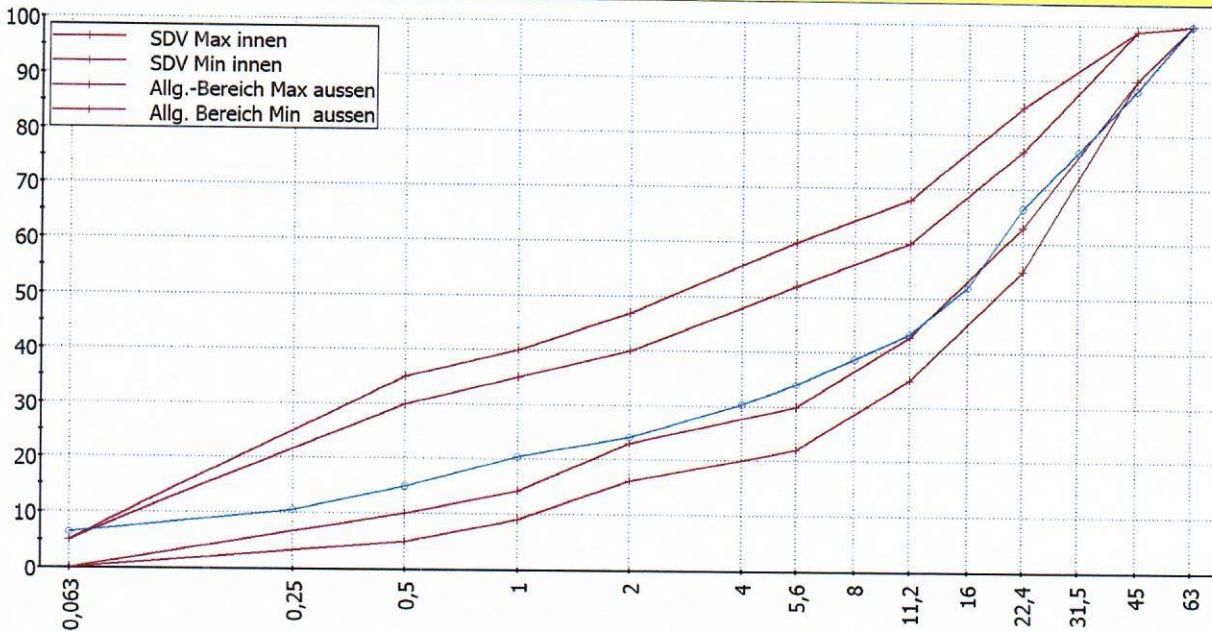

Sieb [mm]	0,063	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Durchg. [%]	6,3	10,4	14,8	20,4	24,1	30,3	34,0	38,7	43,5	52,1	66,4	76,9	88,1	100,0

Siebsatz: Baustoffgemisch

k-Ziffer: 5,32

D-Summe: 367,70

Beurteilung: In Ordnung

Riedlingen, am 30.08.2022


(Johannes Kraus)

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Martin Baur GmbH
Riedstrasse 2
88521 Binzwangen

Prüfung-Nr.: 2019/29/32

Prüfung am: 06.05.2019

Material-Nr.: 18032

Bezeichnung: Kiessand 0/45

Norm: TL SoB-StB 04

Hersteller: Kieswerk Neufra
88499 Riedlingen- Neufra

Kategorie: OC 90;UF 5;SI 50

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kieswerk Neufra

Quandkies

Entnahmedatum: 06.05.2019 - 09:30 (KW:19)

Entnahmeort: Kieswerk Neufra

Entnahmestelle: Produktions-Halde


Probenehmer: Johannes Kraus

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: ca 60 kg

Probeneingang: 06.05.2019 - 10:00

Prüfergebnisse:

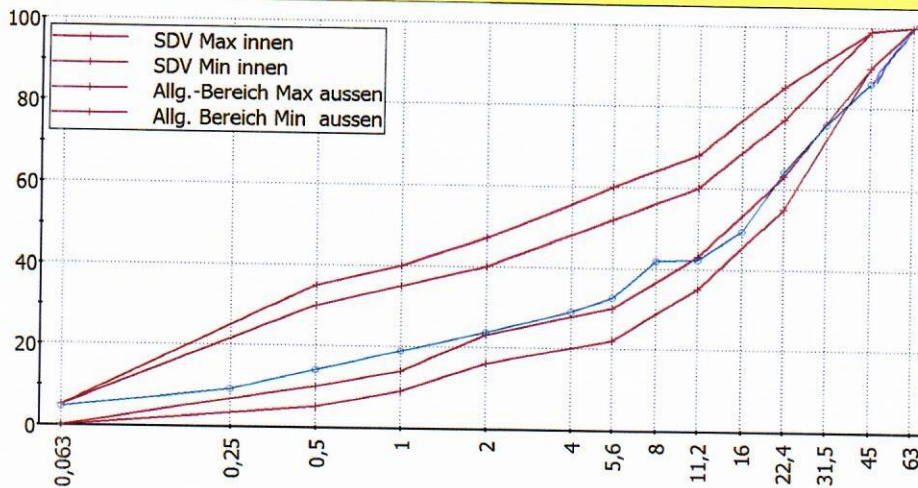

Sieb [mm]	0,063	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Durchg. [%]	4,5	9,1	14,1	18,8	23,6	28,9	32,6	42,0	42,2	49,5	64,1	75,9	86,1	100

Siebsatz: Baustoffgemisch

k-Ziffer:

D-Summe:

Beurteilung: In Ordnung

Riedlingen- Neufra, am 08.05.2019

(Signature)
(Johannes Kraus)

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Martin Baur GmbH
Riedstrasse 2
88521 Binzwangen

Prüfung-Nr.: 2017/144/84

Prüfung am: 28.11.2017

Material-Nr.: 18032

Bezeichnung: Kiessand 0/45

Norm: TL SoB-StB 04

Hersteller: Kieswerk Neufra
88499 Riedlingen- Neufra

Kategorie: OC 90;UF 5;SI 50

Wandkies

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kieswerk Neufra

Entnahmedatum: 28.11.2017 - 15:00 (KW:48)

Entnahmeort: Kieswerk Neufra

Entnahmestelle: Produktions-Halde


Probenehmer: Johannes Kraus

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: ca 60 kg

Probeneingang: 28.11.2017 - 15:30

Prüfergebnisse:

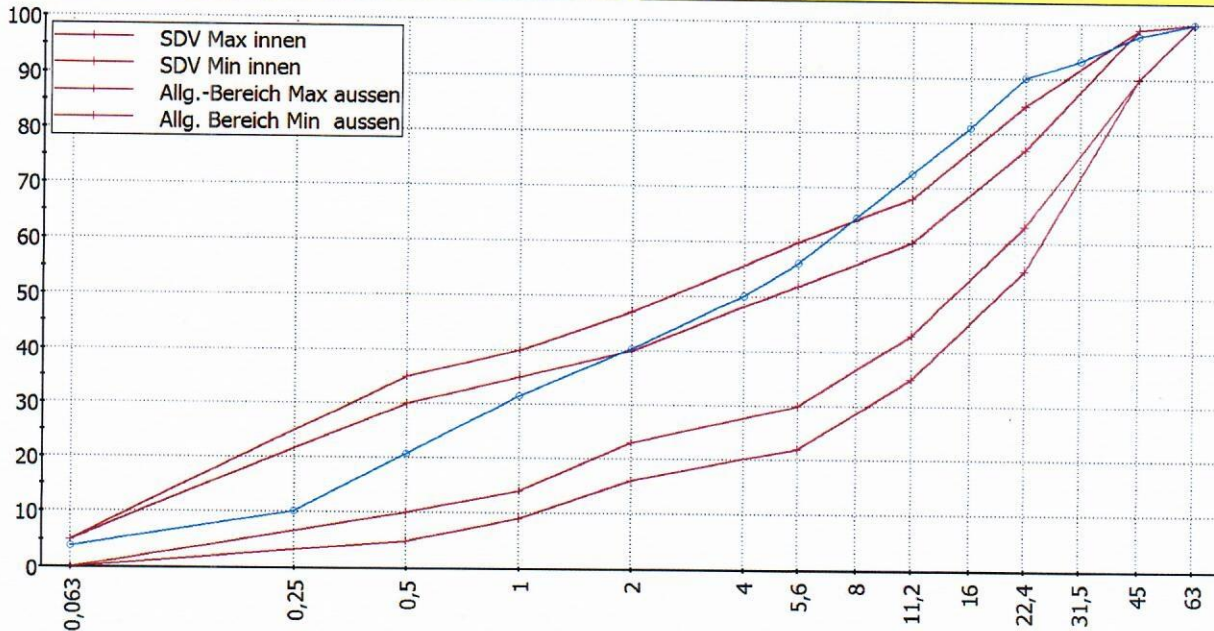

Sieb [mm]	0,063	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Durchg. [%]	3,9	10,1	20,7	31,6	40,3	50,1	56,2	64,5	72,5	81,1	90,1	93,2	98,0	100,0

Siebsatz: Baustoffgemisch

k-Ziffer: 4,08

D-Summe: 491,56

Beurteilung: In Ordnung

Riedlingen- Neufra, am 01.12.2017

Kraus

(Johannes Kraus)

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Martin Baur GmbH
Riedstrasse 2
88521 Binzwangen

Prüfung-Nr.: 2017/106/32

Prüfung am: 13.09.2017

Material-Nr.: 18032

Bezeichnung: Kiessand 0/45

Norm: TL SoB-StB 04

Hersteller: Kieswerk Neufra
88499 Riedlingen- Neufra

Kategorie: OC 90;UF 5;SI 50

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:

Lieferant: Kieswerk Neufra

Wandkies

Entnahmedatum: 13.09.2017 - 16:00 (KW:37)

Entnahmeort: Kieswerk Neufra

Entnahmestelle: Produktions-Halde


Probenehmer: Johannes Kraus

Art der Probe: Einzelprobe

Probemenge: ca 60 kg

Probeneingang: 13.09.2017 - 17:00

Prüfergebnisse:

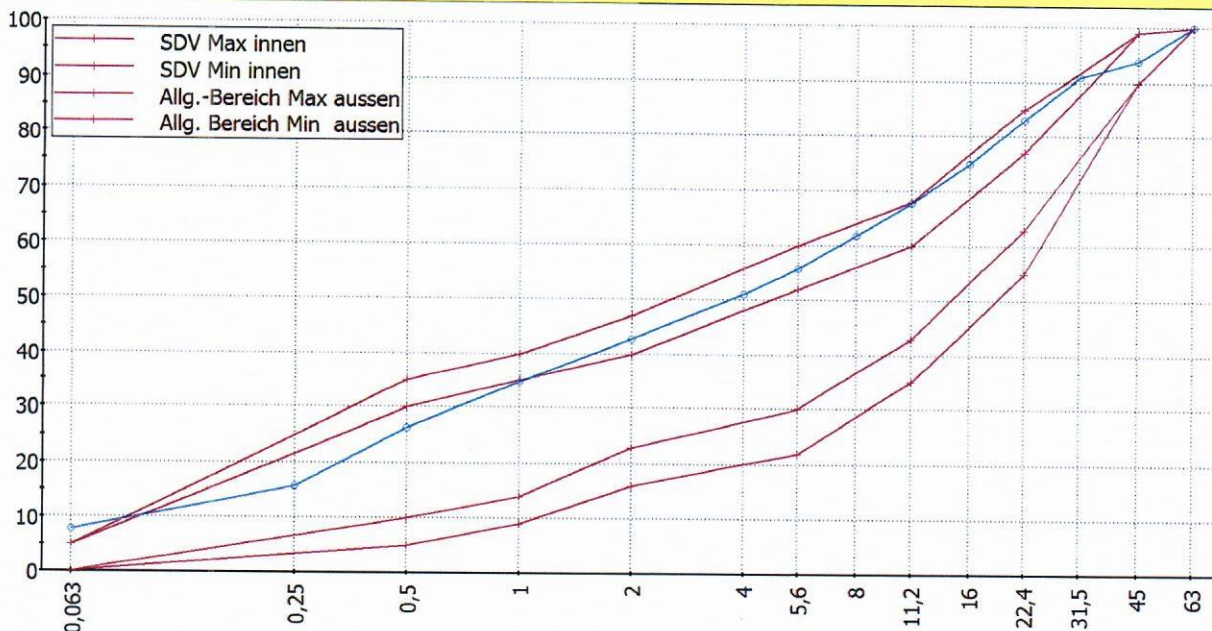

Sieb [mm]	0,063	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Durchg. [%]	7,6	15,6	26,3	34,7	42,8	51,0	55,7	61,7	67,8	75,0	83,0	90,9	93,8	100,0

Siebsatz: Baustoffgemisch

k-Ziffer: 4,02

D-Summe: 497,92

Kornform(Meßschieber): 14 M-%

Feinanteile: 7,6 M-%

Eigenfeuchte: 4,64 M-%

Beurteilung: In Ordnung

Riedlingen- Neufra, am 20.09.2017

Kraus

(Johannes Kraus)
