





**Jahr 1 bis 4**  
 Abschnitt I & VIII: Abbau einschl. Herstellung Ausweichhabitate Zauneidechse  
 Abschnitt II: Rodung  
 Abschnitt III bis VII: Erhalt  
 Umbau Waldmantel (ca. 60 %) in Abstimmung mit UNB und Forstbehörde

**Jahr 5 bis 7**  
 Abschnitt I: Verfüllung einschl. Herstellung Ersatzhabitate Zauneidechse  
 Abschnitt II: Abbau einschl. temporäre Kleingewässer  
 Abschnitt III: Rodung  
 Abschnitt IV bis VII: Erhalt  
 Abschnitt VIII: Herstellung und Unterhalt Betriebsfläche  
 Umbau Waldmantel (ca. 20 %) in Abstimmung mit UNB und Forstbehörde

**Jahr 8 bis 10**  
 Abschnitt I: Rekultivierung einschl. Erhalt und Pflege Ersatzhabitate Zauneidechse  
 Abschnitt II: Verfüllung  
 Abschnitt III: Abbau einschl. temporäre Maßnahmen  
 Abschnitt IV: Rodung  
 Abschnitt V bis VII: Erhalt  
 Abschnitt VIII: Betriebsfläche  
 Umbau Waldmantel (ca. 20 %) in Abstimmung mit UNB und Forstbehörde

**Jahr 11 bis 13**  
 Abschnitt I: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege einschl. Erhalt und Pflege Ersatzhabitate Zauneidechse  
 Abschnitt II: Rekultivierung  
 Abschnitt III: Verfüllung  
 Abschnitt IV: Abbau einschl. temporäre Maßnahmen  
 Abschnitt V: Rodung  
 Abschnitt VI & VII: Erhalt  
 Abschnitt VIII: Betriebsfläche  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

**Jahr 14 bis 16**  
 Abschnitt I: weiterführende Pflege einschl. Ersatzhabitate Zauneidechse bei Bedarf  
 Abschnitt II: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege  
 Abschnitt III: Rekultivierung  
 Abschnitt IV: Verfüllung  
 Abschnitt V: Abbau einschl. temporäre Maßnahmen  
 Abschnitt VI: Rodung  
 Abschnitt VII: Erhalt  
 Abschnitt VIII: Betriebsfläche  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

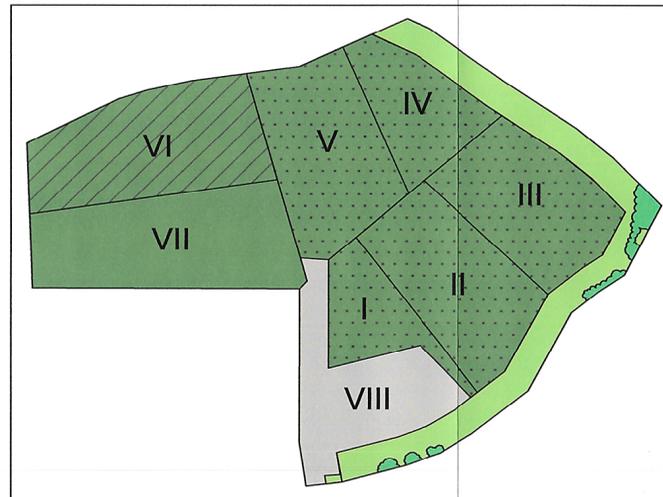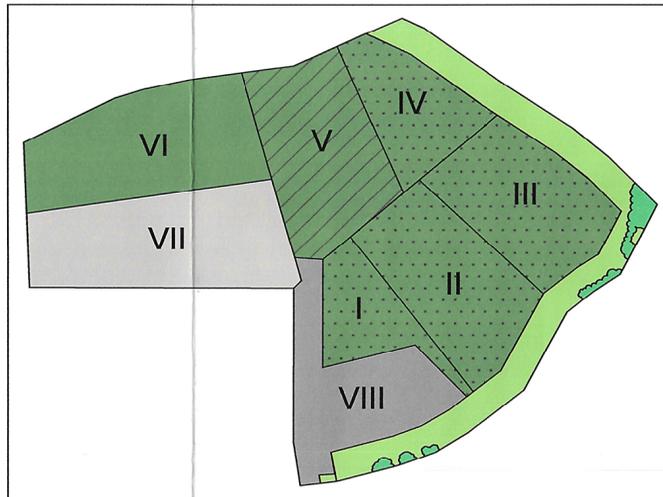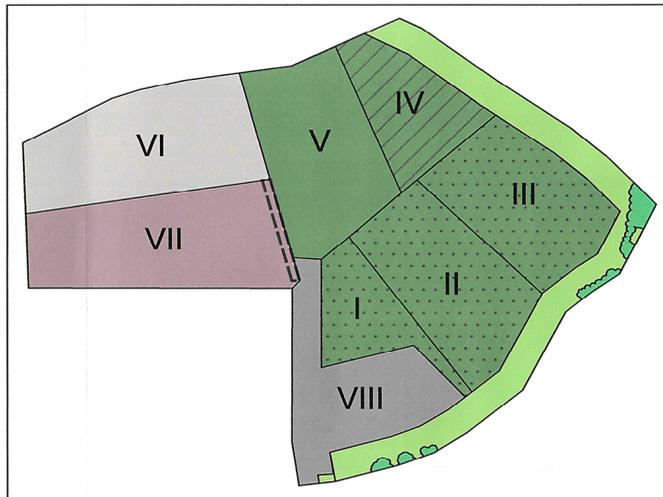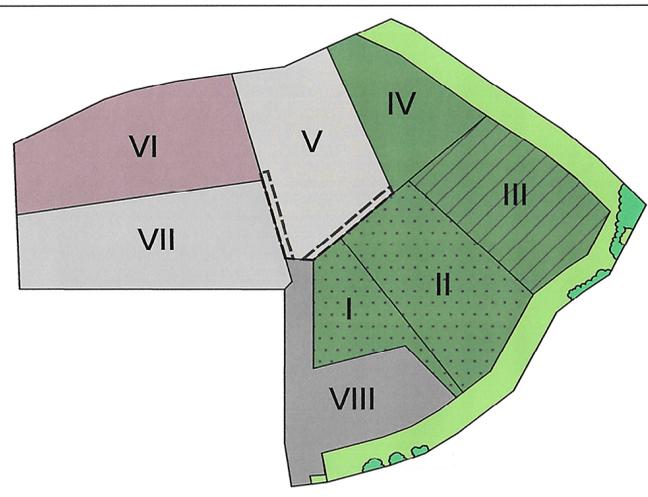

**Jahr 17 bis 20**  
 Abschnitt I: weiterführende Pflege einschl. Ersatzhabitate Zauneidechse bei Bedarf  
 Abschnitt II: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt III: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege  
 Abschnitt IV: Rekultivierung  
 Abschnitt V: Verfüllung  
 Abschnitt VI: Abbau einschl. temporäre Maßnahmen  
 Abschnitt VII: Rodung und Beginn Abbau  
 Abschnitt VIII: Betriebsfläche  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

**Jahr 20 bis 23**  
 Abschnitt I: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt II: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt III: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt IV: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege  
 Abschnitt V: Rekultivierung einschl. Herstellung Zauneidechsen-Lebensräume, inkl. Fertigstellungspflege  
 Abschnitt VI: Verfüllung  
 Abschnitt VII: Abbau einschl. temporäre Maßnahmen  
 Abschnitt VIII: Betriebsfläche  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

**Jahr 24**  
 Abschnitt I: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt II: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt III: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt IV: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt V: Entwicklungspflege  
 Abschnitt VI: Rekultivierung inkl. Fertigstellungspflege  
 Abschnitt VII: Verfüllung und Rekultivierung  
 Abschnitt VIII: Rückbau Betriebsfläche  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

**Jahr 25**  
 Abschnitt I: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt II: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt III: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt IV: weiterführende Pflege bei Bedarf  
 Abschnitt V: Entwicklungspflege  
 Abschnitt VI: Entwicklungspflege  
 Abschnitt VII: Rekultivierung, anschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege  
 Abschnitt VIII: Verfüllung und Rekultivierung, anschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege  
 Pflege und Erhalt Waldmantel

Eingang

04. April 2024

Landratsamt Aichach-Friedberg  
 Untere Bauaufsichtsbehörde

- Rodung
- Abbau
- Verfüllung
- Rekultivierung
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- weiterführende Pflege bei Bedarf
- Betriebsgelände
- Erhalt Waldfläche
- Umbau, Pflege und Erhalt Waldmantel
- mögliche Zu- und Abfahrt

Bauherr: Schweiger Straßenbau GmbH  
 Schmelchen 2  
 85250 Altomünster

Bauvorhaben: Antrag zum Trockenabbau von Sand u. Kies mit Wiederverfüllung und Rekultivierung  
 Fl.-Nr. 1228 (TF), Gmkg. Aufhausen, Gmde. Schiltberg

Planart: Ablauf

Maßstab: maßstabslos Beilage: 11\_2024

Bearbeitet: HB / HL  
 Gezeichnet: HL  
 Geprüft: HB  
 Plan-Nr.: 2134\_LAB\_2024\_Abbau

Datum: 03.04.2024  
 Plangröße: 350 x 710 mm  
 Datei / Pfad: Q:\Objekt\2134\Pläne\Entwürfe\2134\_LAB\_2024.dwg
