


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 13  
Entnahmetiefe 7,25  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel  
Einbau 04.01.2017  
ausgeführt am 04.01.2017  
ausgeführt von Fr

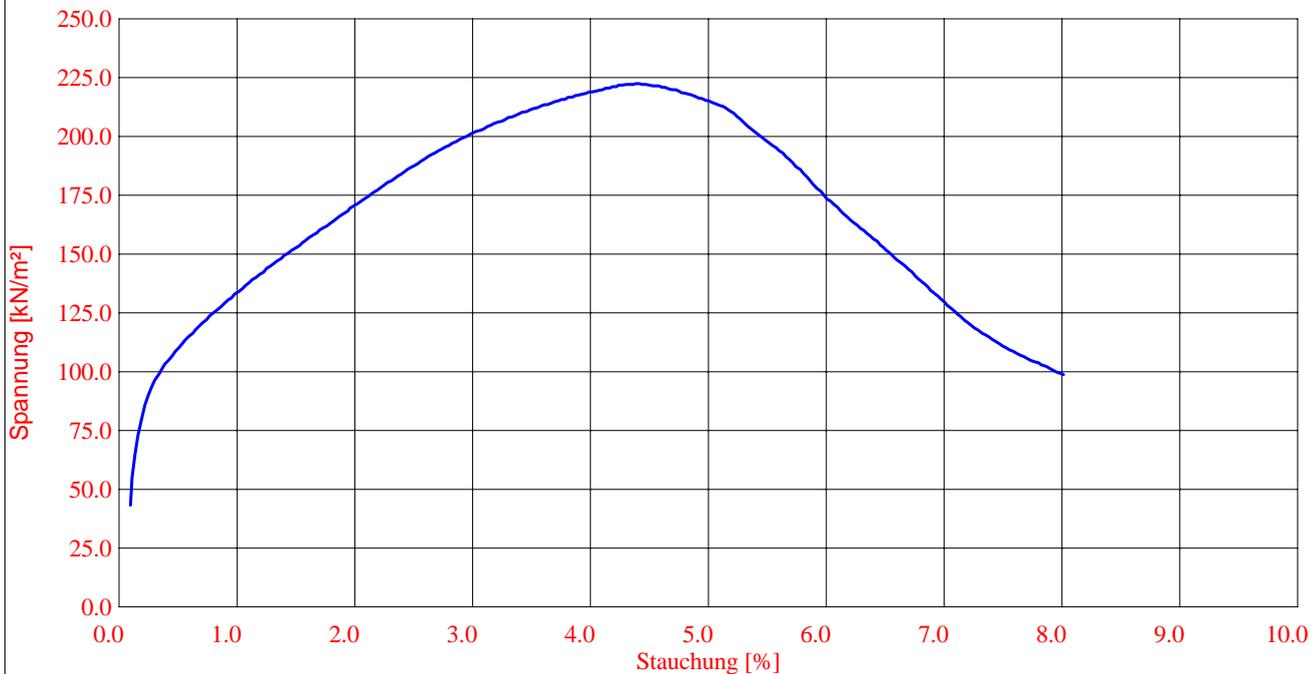

### Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 222.197  
Stauchung [%] 4.389  
Geschwindigkeit [mm/min] 2.00000  
Probenfläche [cm²] 104.852  
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 203.824

### Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 225.00  
Probenfläche [cm²] 100.25  
Probenvolumen [cm³] 2255.625  
Feuchtemasse (Einbau) [g] 4861.000  
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000  
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.155  
Wassergehalt (Einbau) [%] 11.50  
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00
