


EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 70
 Entnahmetiefe 29,45
 Entnahmetag
 Bodenart Geschiebemergel
 Einbau 04.01.2018
 ausgeführt am 04.01.2018
 ausgeführt von Ti

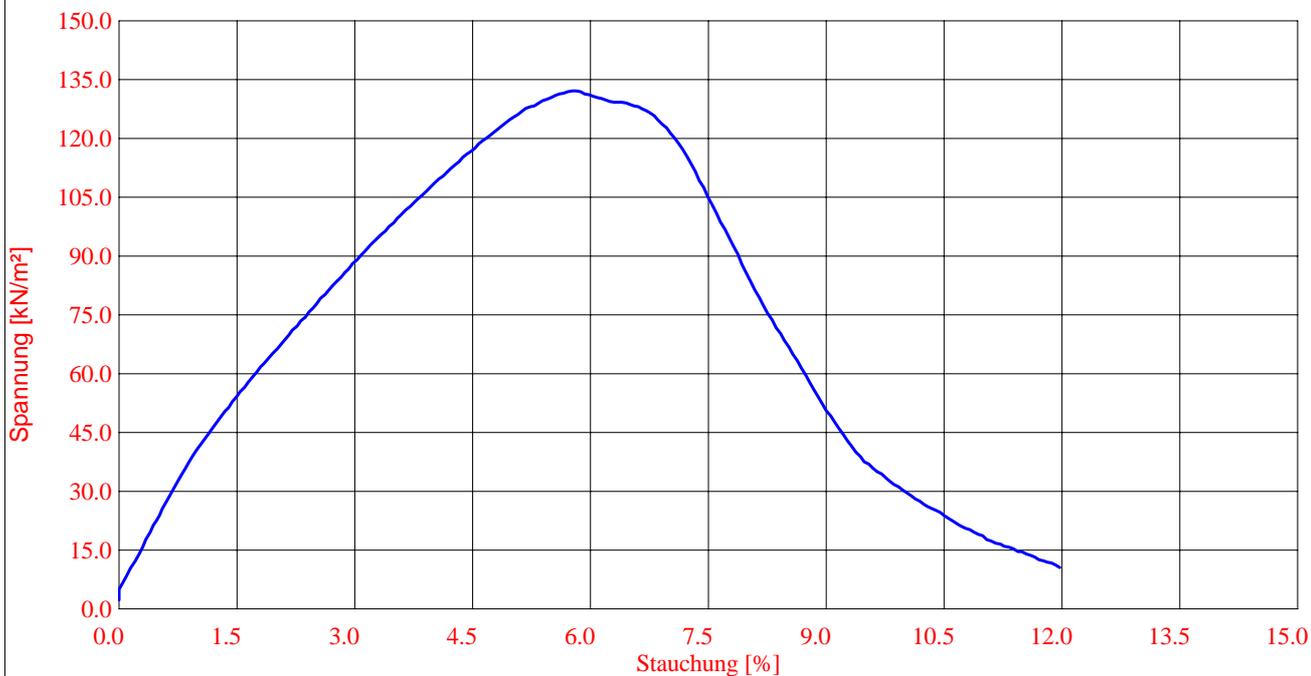

Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 131.922
 Stauchung [%] 5.858
 Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000
 Probenfläche [cm²] 106.478
 Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 12905.612

Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 240.00
 Probenfläche [cm²] 100.24
 Probenvolumen [cm³] 2405.760
 Feuchtemasse (Einbau) [g] 5671.000
 Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000
 Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.357
 Wassergehalt (Einbau) [%] 11.9
