


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 57/17  
Entnahmetiefe 28.25  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel,sandig  
Einbau 28,05,18  
ausgeführt am 28,05,18  
ausgeführt von Ak

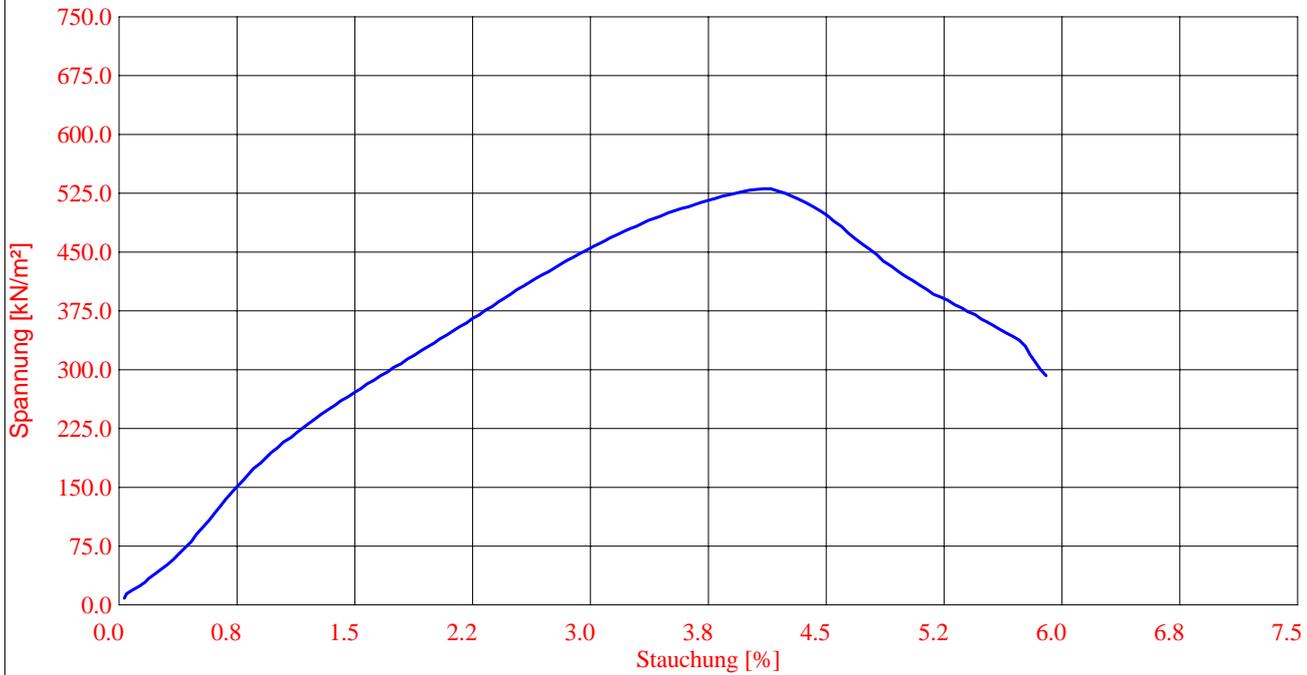

### Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 530.451  
Stauchung [%] 4.151  
Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000  
Probenfläche [cm²] 102.735  
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 30.981

### Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 200.00  
Probenfläche [cm²] 98.47  
Probenvolumen [cm³] 1969.400  
Feuchtemasse (Einbau) [g] 4422.500  
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000  
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.246  
Wassergehalt (Einbau) [%] 10.20  
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00
