


## EINAXIALER DRUCKVERSUCH nach DIN 18 136

Entnahmestelle B 15  
Entnahmetiefe 28,25  
Entnahmetag  
Bodenart Geschiebemergel  
Einbau 03.01.2017  
ausgeführt am 03.01.2017  
ausgeführt von Ti

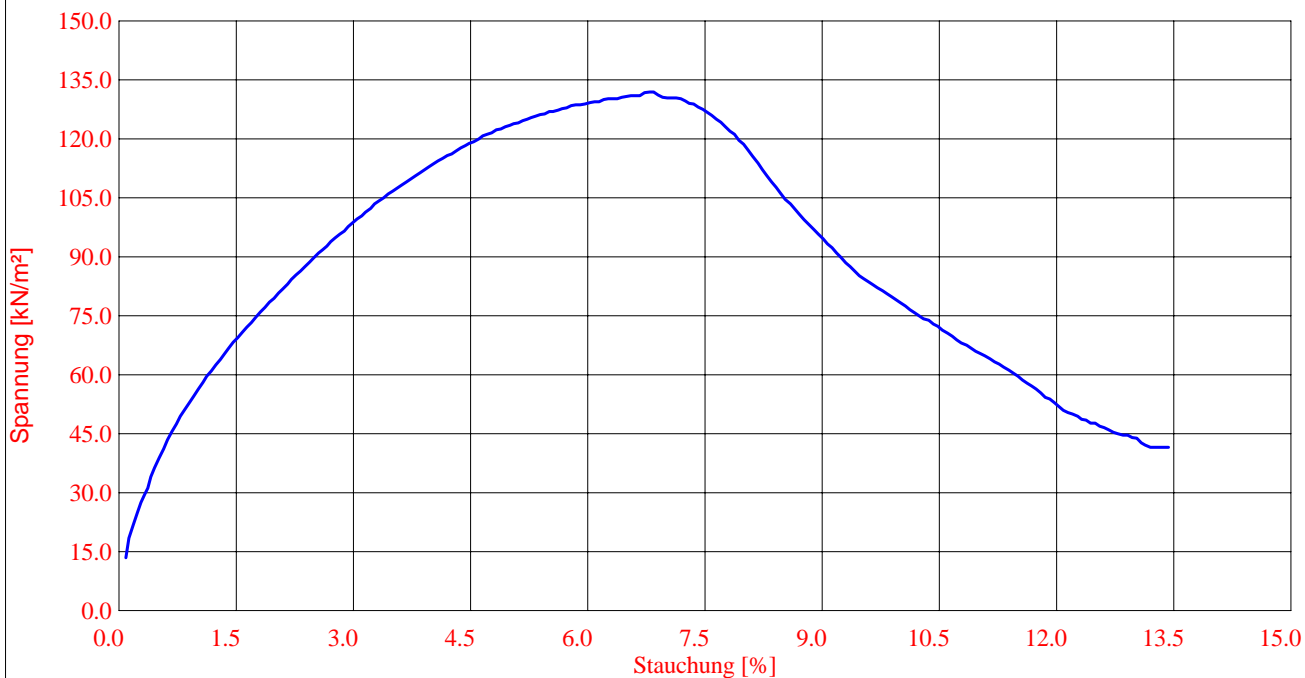

### Bruchparameter

Druckspannung [kN/m²] 132.217  
Stauchung [%] 6.886  
Geschwindigkeit [mm/min] 2.50000  
Probenfläche [cm²] 107.653  
Modul des einaxialen Druckversuches [MN/m²] 37.137

### Probenmerkmale

Probenhöhe [mm] 217.00  
Probenfläche [cm²] 100.24  
Probenvolumen [cm³] 2175.208  
Feuchtemasse (Einbau) [g] 4933.000  
Feuchtemasse (Ausbau) [g] 0.000  
Dichte (Einbau) [g/cm³] 2.268  
Wassergehalt (Einbau) [%] 11.10  
Wassergehalt (Ausbau) [%] 0.00
