


Bauphase 1 1:200

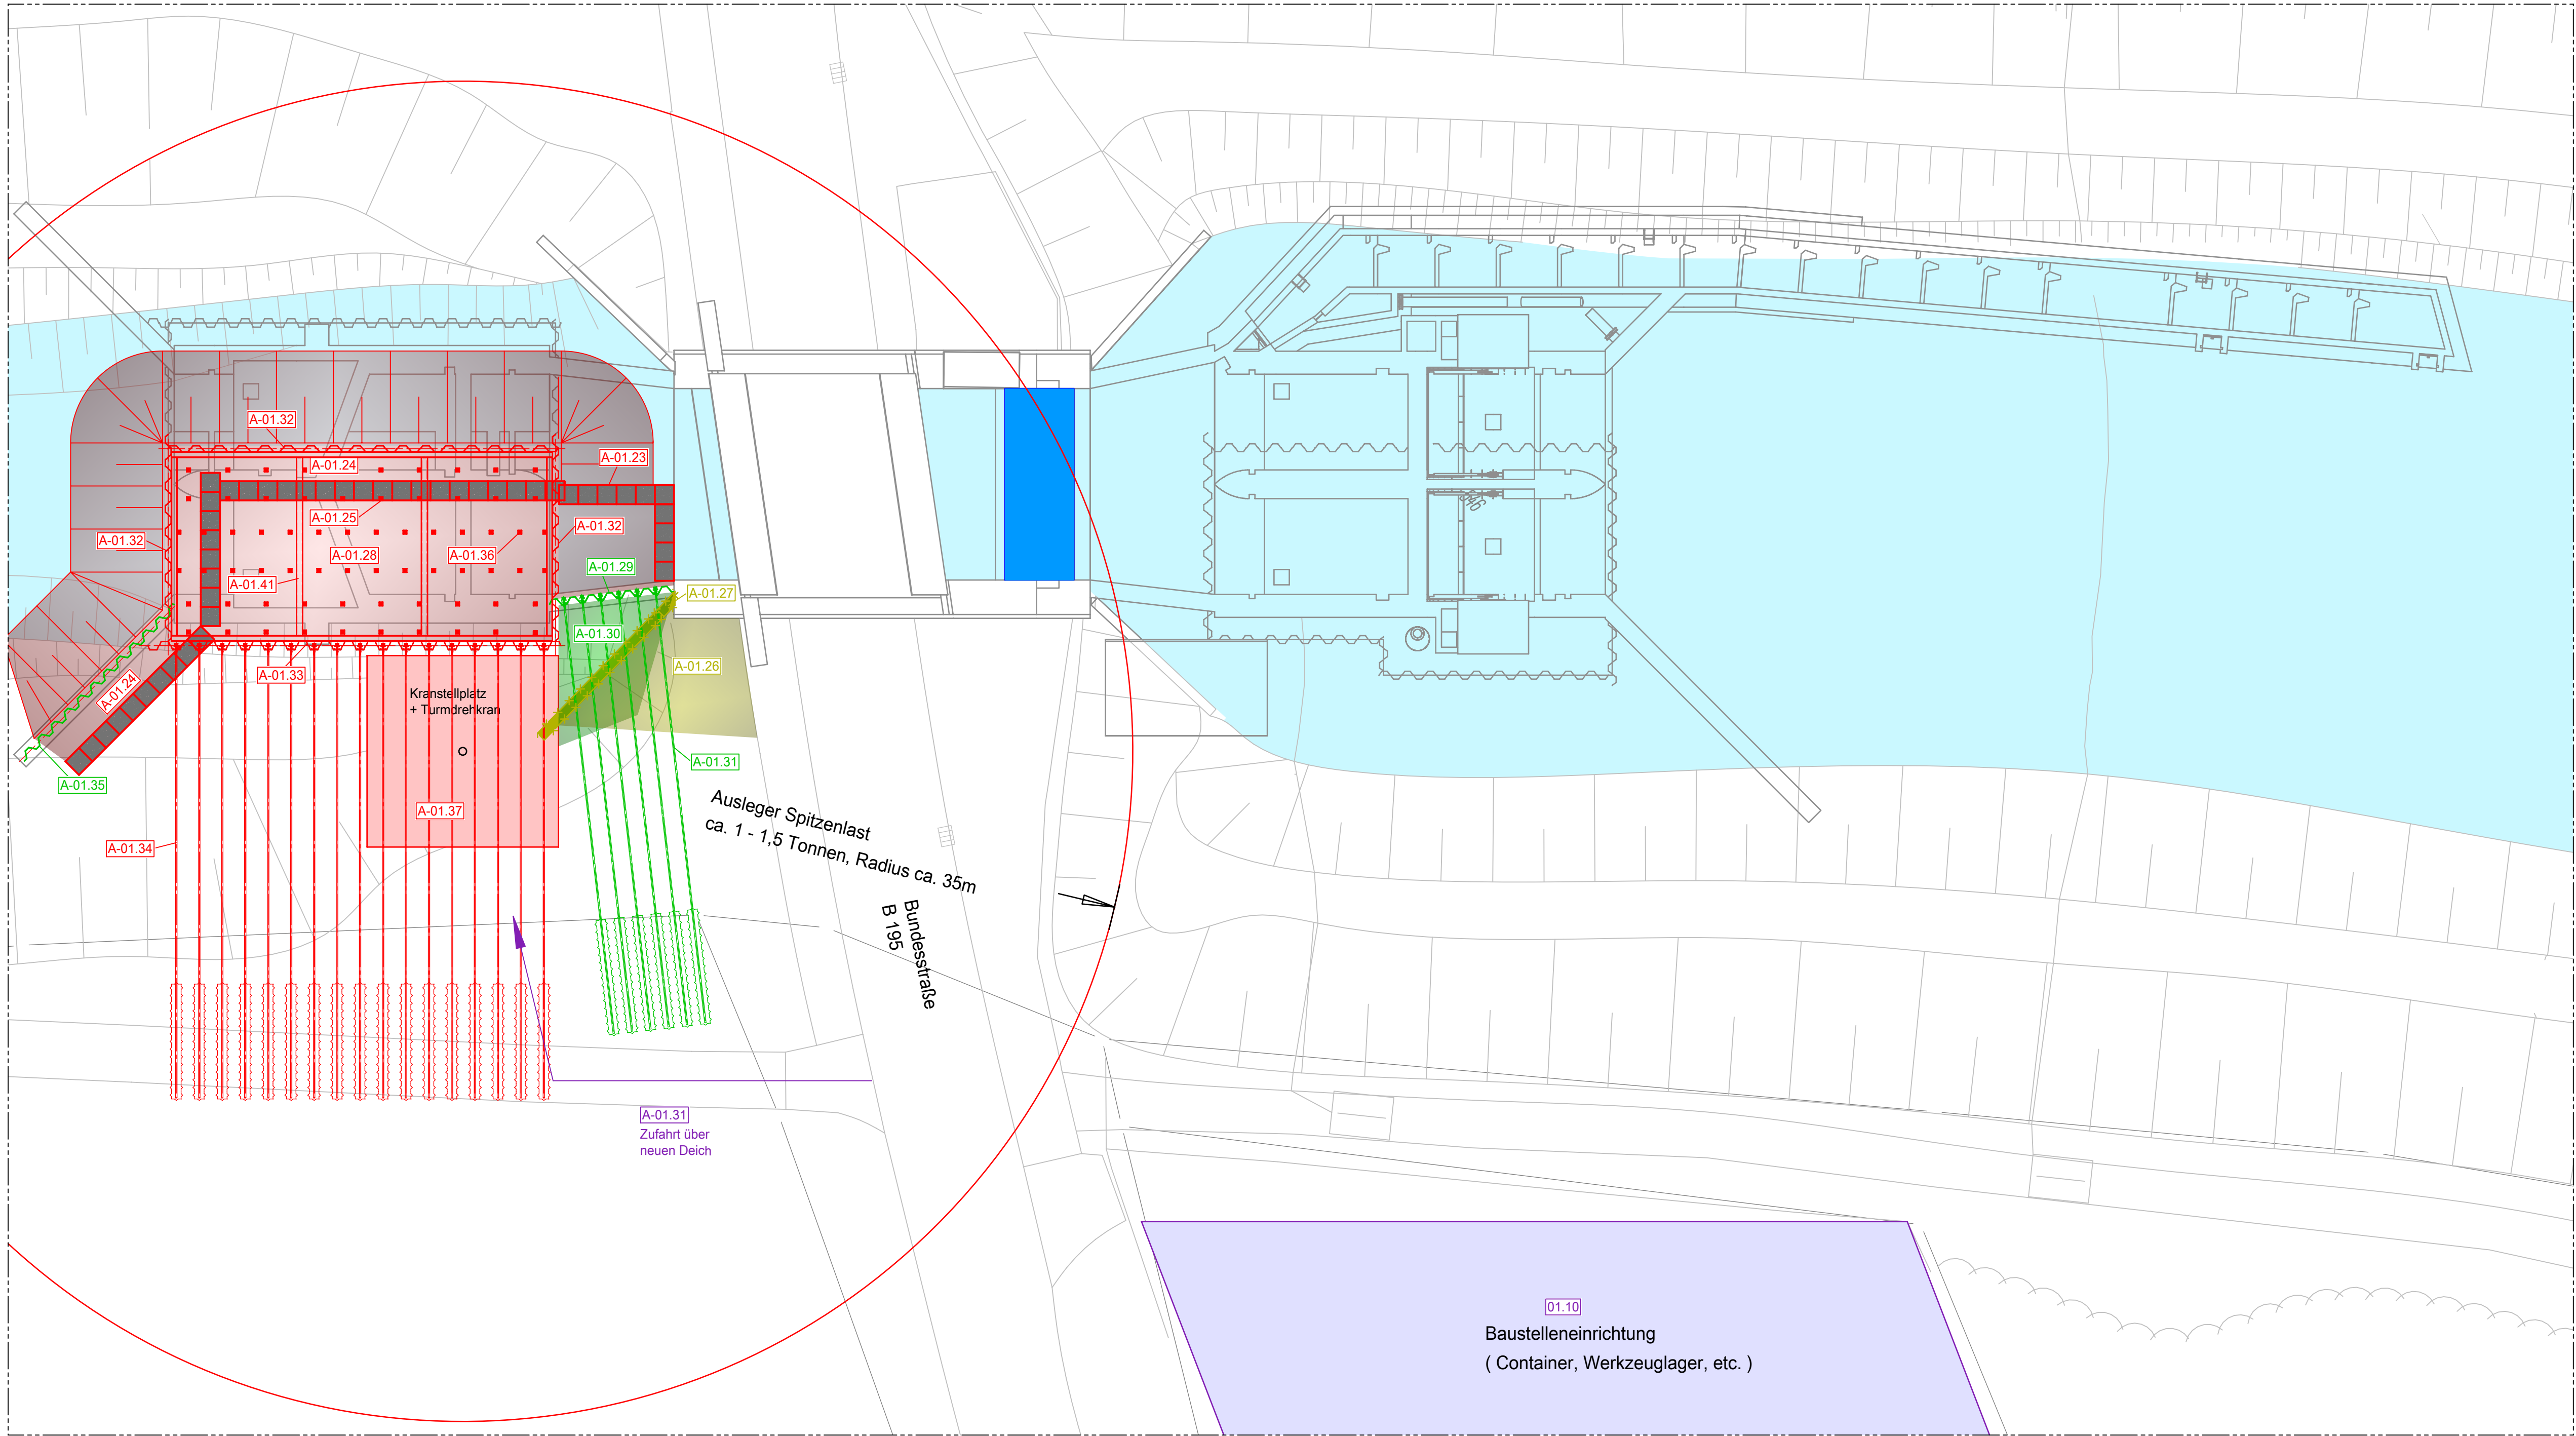

01.10 Baustelleneinrichtung auf der Grünfläche des Bauhofs
(Container, Werkzeuglager, etc.)

HWSA:

A-01.20 Baustellenzufahrt über neuen Deich einrichten

A-01.21 Flusssedimente baggern

A-01.22 Mutterboden am Ufer baggern

A-01.23 Gabionen im Übergangsbereich setzen

A-01.24 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten

A-01.25 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

A-01.26 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen

A-01.27 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen

und Spundwand ziehen

A-01.28 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten

A-01.29 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren

und Spundwand im Übergangsbereich rammen

A-01.30 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

A-01.31 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich einbringen

A-01.32 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren

und Spundwände wasserseitig rammen

A-01.33 Lockerungsbohrungen bohren und landseitige Spundwände rammen

A-01.34 Verpressanker als Kurzzeitlitzanker einbringen

A-01.35 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren

und Spundwände rammen

A-01.36 Zugfahle im Spundwandkasten einbringen

A-01.37 Kranfundament herstellen

A-01.38 Aufschüttung im Übergangsbereich baggern

A-01.39 Gabionen im Übergangsbereich ausheben

A-01.40 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

A-01.41 Gurtung und Steifen einbauen

A-01.42 Spundwandkasten ausheben

A-01.43 Zugfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

A-01.44 UW-Betonsohle betonieren

A-01.45 Baugrube trockenlegen

A-01.46 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen

Tabelle 1: Wehr - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

	OW [m NHN]	UW [m NHN]
Betriebsfall I (Normalbetrieb)	+12,031 / +12,531	+10,240
Betriebsfall II (Lockitzhochwasser)	+12,760	+10,240
Betriebsfall III (HW Elbe Schleierkappung)	+15,981	+15,981
Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen)	+15,981	+15,981
Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren)	+12,031 / +12,531	+14,420
Betriebsfall VI (Düsenicherung)	+15,981	+10,240

* Wasserstände der Betriebsfälle gemäß: Lastenheft - Stand Erneuerplanung


Tabelle 2: HWSA - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

	OW [m NHN]	UW [m NHN]
Betriebsfall I	+10,240	+10,240
Betriebsfall II	+10,240	+10,240
Betriebsfall III (HW Elbe)	+12,531	+18,081
Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen)	+15,981	+15,981
Betriebsfall V	+14,420	+14,420
Betriebsfall VI	+10,240	+10,240

Legende

Neubau	Stauraufbauendes Bauwerk in Betrieb
Temporäres Bauteil	Sonstiges
Abriß	

Bauphase 2 1:200

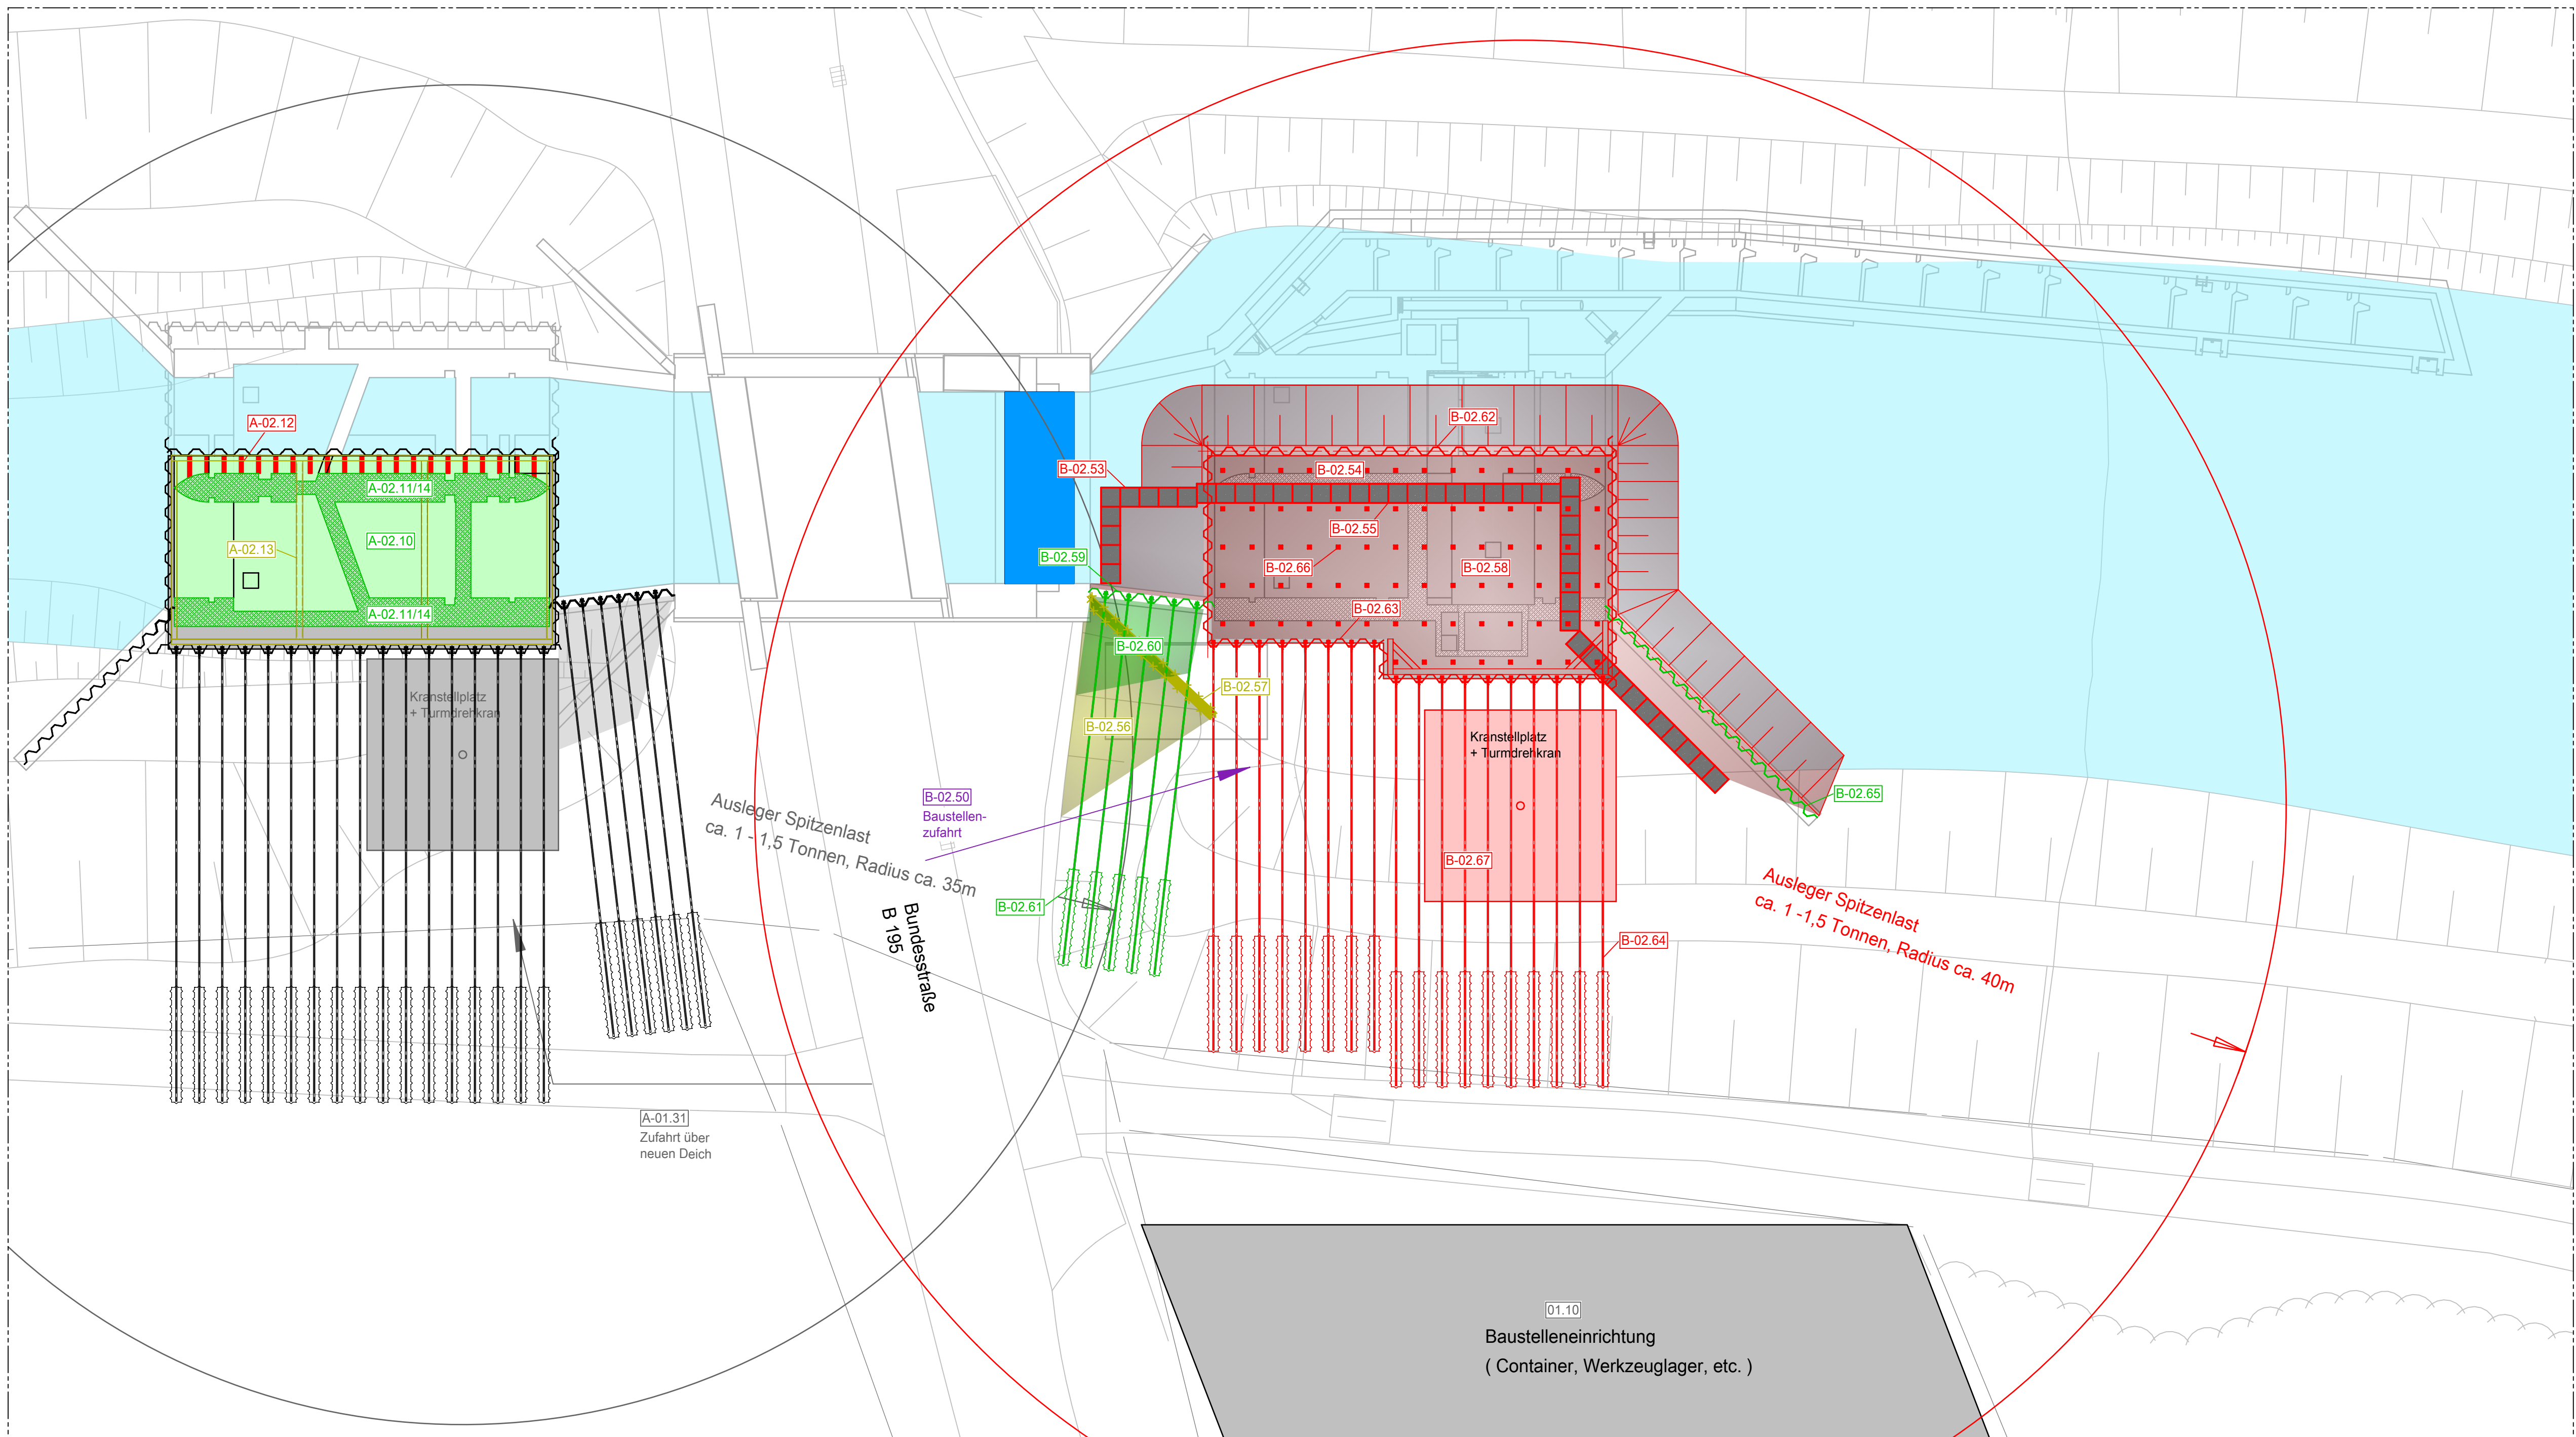

HWSA:

A-02.10 Massivbausohle herstellen

A-02.11 Wände bis unter die Steifen herstellen

A-02.12 Wasserseitige Spundwände auf Massivbauwände umsteifen
(mit Kantholzern)

A-02.13 Gurte und Steifen aus Bph1 entfernen

A-02.14 Wände und Staubaiken bis OK Planie fertigstellen

WEHR:

B-02.50 Baustellenzufahrt einrichten

B-02.51 Flusssedimente baggern

B-02.52 Mutterboden am Ufer baggern

B-02.53 Gabionen im Übergangsbereich setzen

B-02.54 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten

B-02.55 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

B-02.56 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen

B-02.57 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen

und Spundwand ziehen

B-02.58 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten

B-02.59 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren

und Spundwand im Übergangsbereich rammen

B-02.60 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

B-02.61 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich einbringen

B-02.62 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren

und Spundwände wasserseitig rammen

B-02.63 Lockerungsbohrungen bohren und Spundwände landseitig rammen

B-02.64 Verpressanker als Kurzzeitlitzanker einbringen

B-02.65 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren

und Spundwände rammen

B-02.66 Zugfahle im Spundwandkasten einbringen

B-02.67 Kranfundament herstellen

B-02.68 Aufschüttung im Übergangsbereich baggern

B-02.69 Gabionen im Übergangsbereich ausheben

B-02.70 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

B-02.71 Spundwandkasten ausheben

B-02.72 Zugfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

B-02.73 UW-Betonsohle betonieren

B-02.74 Baugrube trockenlegen

B-02.75 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen

Version/Index	Änderung bzw. Ergänzung / zugehörige Pläne	Datum	Name
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung

Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
Geprüft und freigegeben	Unterschrift		Arbeits-/Dienstbezeichnung
