Bauablaufplan AVG und Südhafenerweiterung

Kalenderwochen

Nr.	Vorgang	Dauer in Arbeitstagen
0	**Technische Bearbeitung**	391
1	Abgabe Planfeststellungsantrag	1
2	Vollständigkeitsprüfung	29
3	Sichtung Gutachten	30
4	TOPS und Auslegung	30
5	Erwiederung Stellungnahmen	30
6	Erörterungstermin	1
7	Teilnahmewettbewerb	40
8	Angebotsausarbeitung	89
9	Auftragsvergabe	1
10	Planungsphase	140
11	Planfeststellungsbeschluss	1
12	**Bau AVG**	538
13	Baustelle einrichten und Herrichten der Flächen [3]	30
14	Vorbereiten der Klei- [3+4] und der Sandlagerflächen [3+5]	30
15	Lieferung	67
16	Erdarbeiten Deichvorland [3]	44
17	Landrammung Spundwand und Rohre [1]	50
18	Landrammung Schrägpfähle [1]	60
19	Anschluss Schrägpfähle	60
20	Verfüllen Spundwandkasten [3]	15
21	Herstelllen der Schwimmtiefe und Rückbau Buhnen [2]	50
22	Wasserrammung Rohre [1]	100
23	Wasserrammung Schrägpfähle [1]	100
24	Wasserrammung Spundwände [1]	60
25	Anschluss Schrägpfähle	100
26	Rammung Ortbetonpfähle Platte	44
27	Betonage Betonplatte und Pollerblöcke	66
28	Zufahrt Schutzwand	66
29	Betonholm Schutzwand	88
30	Ausrüstung	110
31	Herstellen der Hafentiefe [2]	80
32	Straßen und Deichbau [3]	109
33	**Bau Südhafen**	273
34	Lieferung	20
35	Abbruch und Rückbau	65
36	Rammarbeiten [1]	65
37	Stahlbau	68
38	Betonarbeiten	60
39	Ausrüstung	45
40	Baustelle räumen und Wiederherstellung der Flächen	15

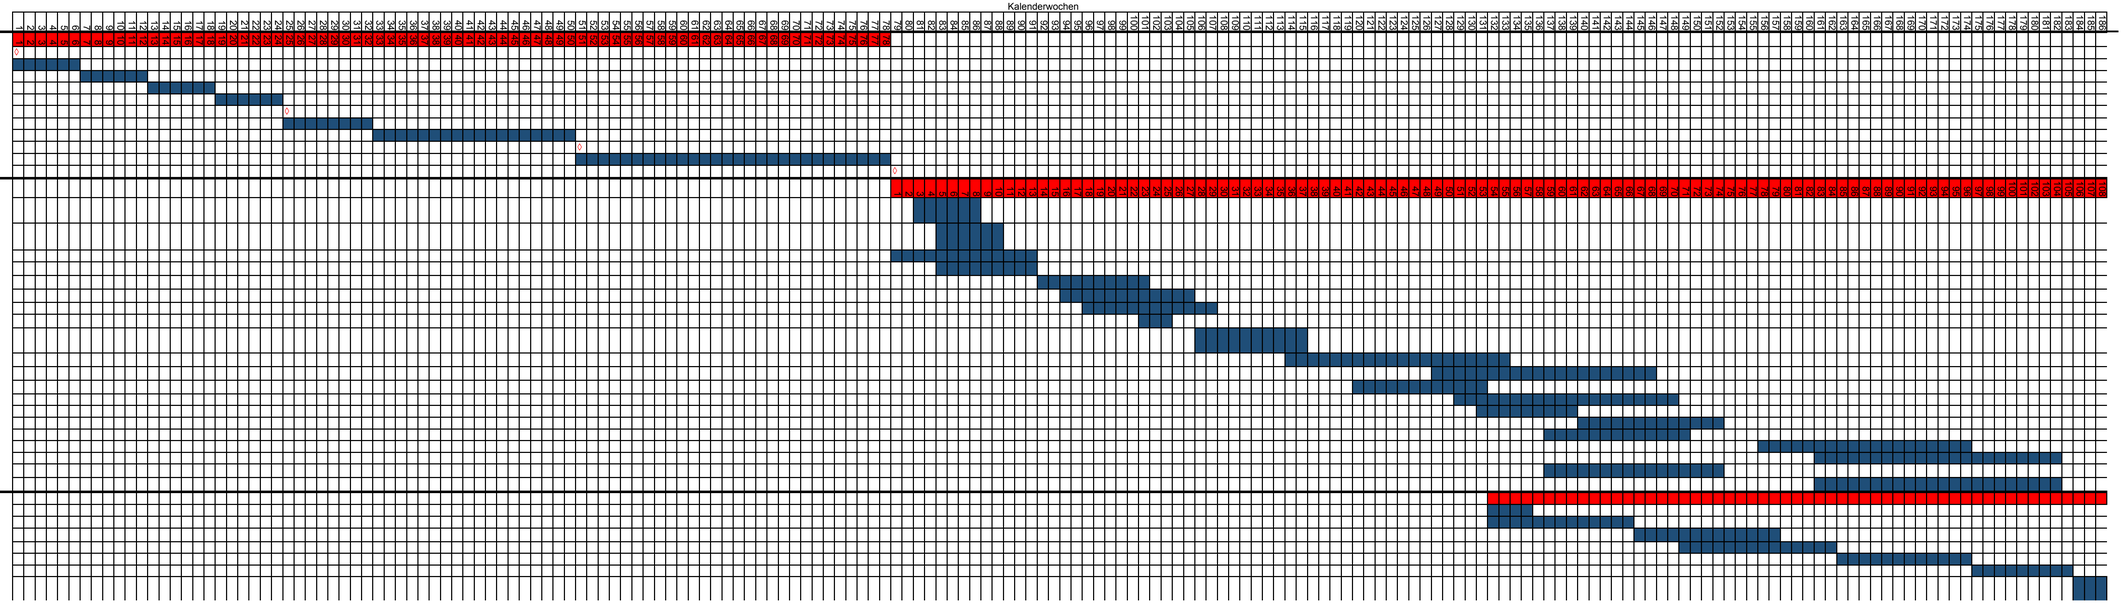

◊ Meilenstein

[1] Keine schlagende Rammung vom 01.03. - 15.06.

[2] Keine wasserseitigen Baggerarbeiten vom 01.04. - 31.08.

[3] Keine Gehölzfällungen sowie keine Beseitigung von Röhrichten zwischen dem 01.03. und 15.11., keine Arbeiten am Deich während der Sturmflutsaison

[4] Nutzungsdauer 5 Jahre, anschließende Wiederherstellung

[5] Nutzungsdauer einer Teilfläche von 5 Jahren mit anschließender Wiederherstellung, Auffüllung dauerhaft

Niedersachsen Ports	Niedersachsen Ports GmbH&Co.KG Niederlassung Cuxhaven Am Schleusenpriel 2 27472 Cuxhaven	
Aufgestellt: Cuxhaven, den 08.06.2022 Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG	ext. Kokselmann A. Schmidt	Niederlassungsleiter AL Technik
Bauablaufplan AVG und SHE		**Blatt 21**
