Planfestgestellt gem. §§ 65 Abs. 1, 66 Abs. 1 u. 4, 67 S. 1 UVPG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 und 2 BayVwVfG; mit Beschluss vom 06.02.2025, AZ.: 6/61-bl

Aschaffenburg, den 26.02.2025

STADT ASCHAFFENBURG

i.A. gez. Blankenburg

Rohrleitungsanlagen DS Smith
Errichtung u. Betrieb zweier Rohrleitungen zur Main-Wasserentnahme u. Abwassereinleitung vom bzw. in den Main

ZEITPLAN - TERMINKONZEPT

Revision 05 - 21.03.2023

Genehmigung/Baubeginn: 13

Dauer (geplant) | Start | %-Abgeschlossen | Hinter Zeitplan | %-Angeschlossen (hinter Zeitplan)
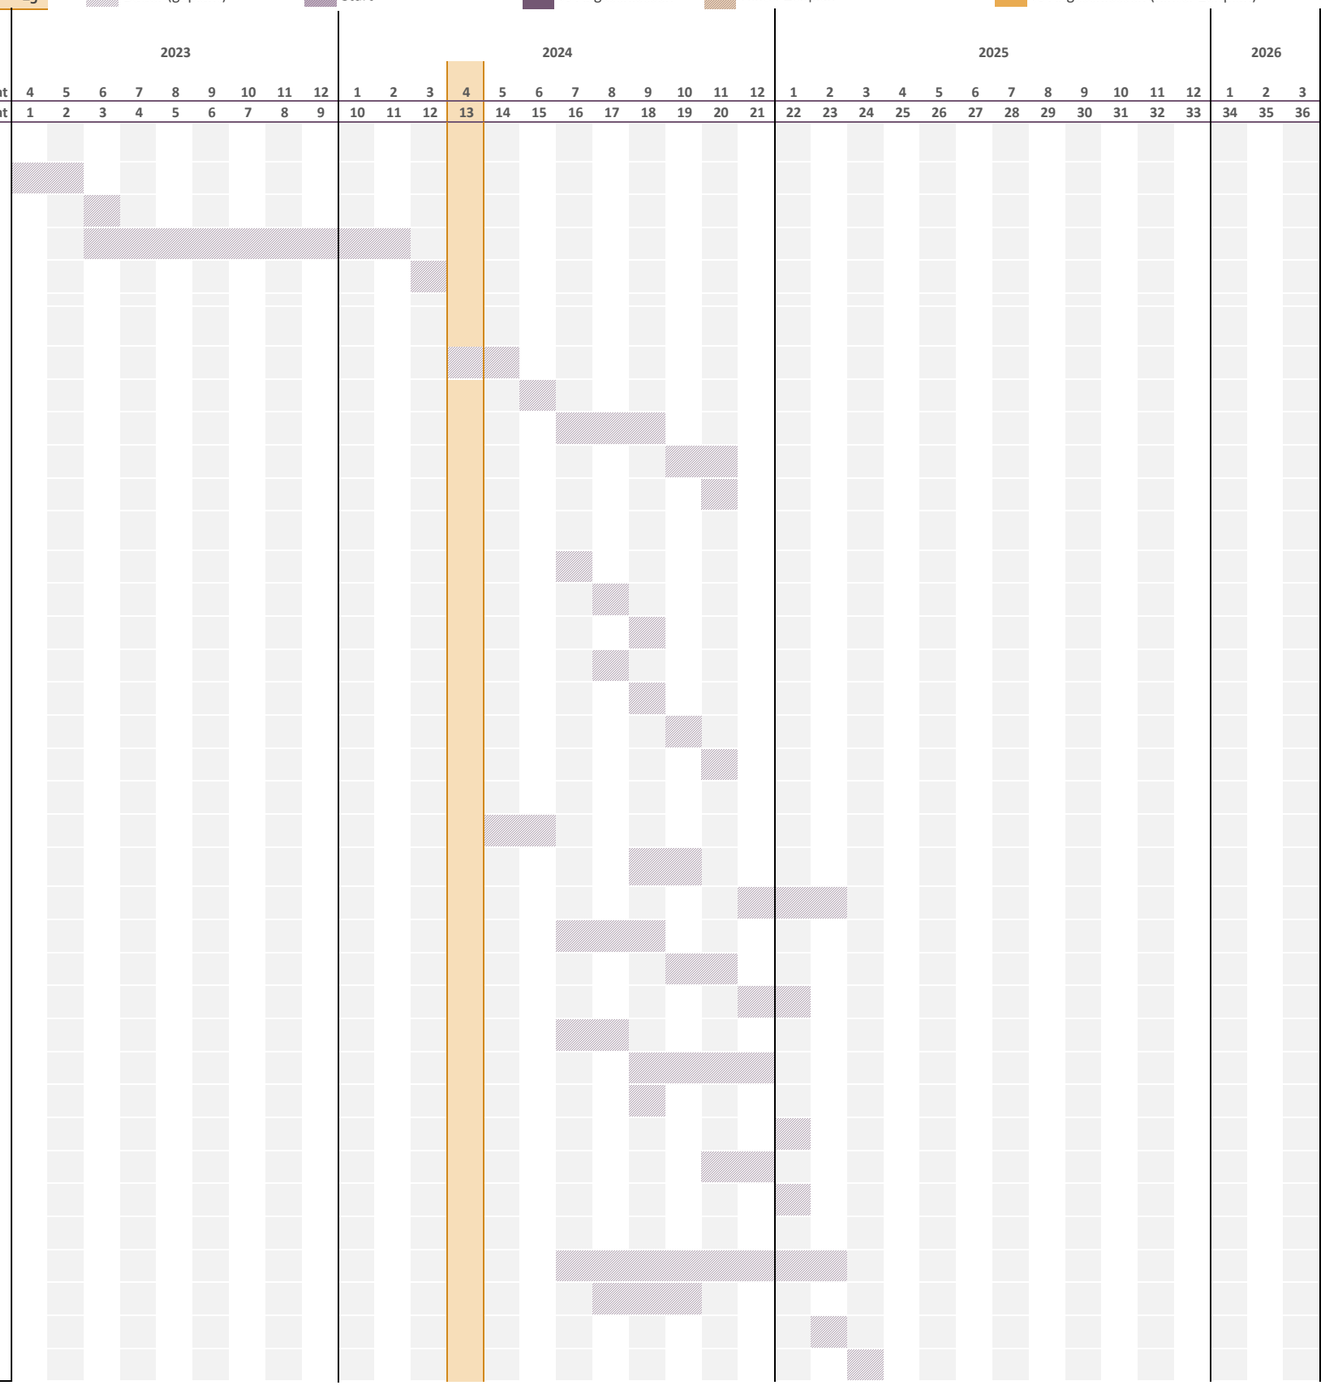
		Abschnitts-länge m	Kolone/Los	START (geplant) Monat	DAUER (geplant) Monat
0. Genehmigungphase					
	Scoping-Unterlagen			**1**	2
	Einreichung Unterlagen			**3**	1
	Genehmigungsprozess			**3**	9
	Bestandskraft nach Ablauf Klagefrist (§ 74 Abs. 1 VwGO)			**12**	1
1. Micro-Tunneling					
MT 1	Startgrube Impress Gelände		8	**13**	2
MT 1	Zielgrube Fa. Bieber		8	**15**	1
MT 1	Micro Tunneling - Impress-Gelände bis Fa. Bieber ("Altes Feuerwehrhaus")	135	8	**16**	3
MT 1	Ausrüstung Tunnel		8	**19**	2
MT 1	Rückbau Baugruben		8	**20**	1
2. Spülborungen					
S 1	Glattbacher Straße		7	**16**	1
S 2	Kindergarten St. Josef		7	**17**	1
S 3	Schneidwiesenpfad-Schulstraße		7	**18**	1
S 4H	Hilfsbaugrube Imptress Gelände		7	**17**	1
S 4a	Impress-Gelände Abschnitt A		7	**18**	1
S 4b	Aschaff und Impress-Gelände Abschnitt B		7	**19**	1
S 5	Aschaff und Bolzplatz		7	**20**	1
3. Konventionelle Bauweise im offenen Graben					
K 1	Betriebsgelände DS Smith bis Glattbacher Straße	350	1	**14**	2
K 2	Glattbacher Straße bis Kindergarten St. Josef	100	1	**18**	2
K 3	Kindergarten St. Josef bis Schulstraße Damm	630	1	**21**	3
K 4	Fa. Bieber bis Lohmgraben	560	2	**16**	3
K 5	Lohmgraben bis Strietwaldstraße	340	2	**19**	2
K 6	Strietwaldstraße bis Brehmweg	350	2	**21**	2
K 7	Bolzplatz bis Daimlerstraße	370	3	**16**	2
K 8	Daimlerstraße bis Kläranlage Aschaffenburg	960	3	**18**	4
K 9	Kläranlage Aschaffenburg bis best. Abwasserleitung DS Smith	200	3	**18**	1
K 10	Kläranlage Aschaffenburg bis Pumpenhaus DS Smith	110	3	**22**	1
K 11	Entnahmebauwerk Main bis Kläranlage Aschaffenburg	260	4	**20**	2
K 12	Zulauf Kläranlage Aschaffenburg bis Pumpenhaus	120	4	**22**	1
4. Bauwerke					
BW 1	Pumpenhaus Kläranlage Aschaffenburg		5	**16**	8
BW 2	Entnahmebauwerk Main		6	**17**	3
5. Inbetriebnahme und Probelauf				**23**	1
6. Übergabe DS Smith				**24**	1
